

МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка» городского округа город Фролово 2026 г.
по Федеральному проекту «Модернизация школьных систем»

Наименование образовательной организации, реализующей программу капитального ремонта 2026 г.	дата	Выполнены виды работ (перечислить на день отчета)	Фотоотчет	
			Было	Стало (по состоянию на день отчета)
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка» городского округа город Фролово	8 -9 января 2026 г.	<p>-Подписан акт о передаче здания детского сада на капитальный ремонт подрядчику;</p> <p>-Рабочие ООО «СК СТРОЙСЕРВИС» приступили к демонтажу дверных проемов и напольного покрытия (линолеума) в групповых помещениях.</p> <p>До 16 января полностью сняты двери и линолеум в групповых помещениях.</p>		
				
				

4- 13
марта
2026

Начались работы по замене электропроводки в групповых помещениях: разметка и монтаж кабель-каналов, прокладка проводов, установка розеток, выключателей, распределительных коробок.



16- 20
марта
2026 г.

Начинаются работы по
монтажу системы
отопления: устройство
проходных отверстий под
стояки инженерных сетей



23-28
марта
2026 г.

Продолжаются работы:
- по монтажу системы
отопления: устройство
проходных отверстий под
стояки инженерных сетей,
установка креплений под
трубопровод отопительной
системы
- по монтажу новой
электропроводки (монтаж
кабель-каналов, установка
розеток).



25 -30
марта
2026

Снятие настенной и
напольной плитки в
санузлах и моечных в
группе, демонтаж унитазов
и раковин в санузлах
групповых помещений



30 марта -
3 апреля
2026 г.

- Прокладка трубопровода
отопительной системы
- Демонтаж санузлов. До 1
апреля работы полностью
завершены
- Продолжаются работы по
монтажу новой
электропроводки.




31 марта -
3 апреля
2026

Приступили к оформлению
фасада детского сада.
Устанавливаются леса,
завезен утеплительный и
отделочный материалы



06 – 11
апреля
2026

- Строители приступили к работам по утеплению фасада минплитой (первый этап в технологии «мокрый фасад»)
- Прокладывается кабель-канал для электропроводки.
- Ведутся работы по монтажу отопления
- Завершены работы по демонтажу радиаторов во всем здании

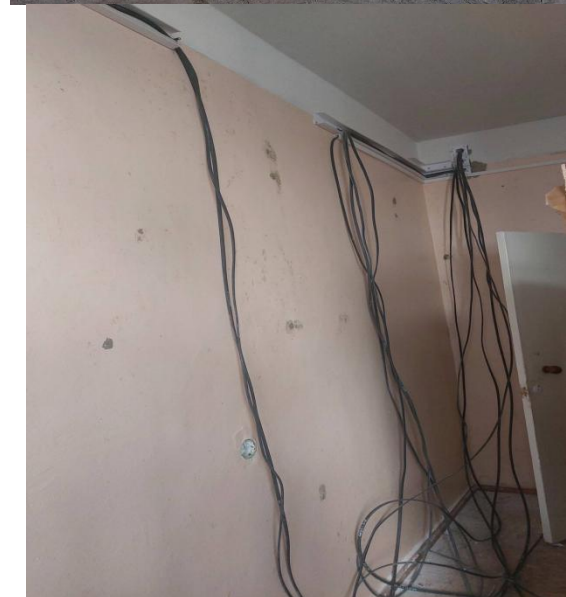

13 – 17
апреля
2026

Ведутся работы по
монтажу отопления.



Продолжаются работы по
монтажу новой
электропроводки (монтаж
кабель-каналов, установка
розеток, выключателей).



Идет работа по утеплению фасада



25 - 25
апреля
2026

Началась установка новых
пластиковых окон



Произведено утепление части фасада здания.
Стартовали работы по базовой штукатурке фасада



Продолжается монтаж новой электропроводки, в том числе в подвале (монтаж кабель-каналов, установка розеток, выключателей).



Ведутся дальнейшие работы по монтажу отопления.

27 апреля
-
1 мая
2026

Производится монтаж
отопления (обвязка
радиаторов)



Производится очистка,
грунтовка, шпатлевка
потолков



Продолжаются работы по
монтажу новой
электропроводки

