

МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка» городского округа город Фролово 2026 г.
по Федеральному проекту «Модернизация школьных систем»

Наименование образовательной организации, реализующей программу капитального ремонта 2026 г.	дата	Выполнены виды работ (перечислить на день отчета)	Фотоотчет	
			Было	Стало (по состоянию на день отчета)
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка» городского округа город Фролово	8 -9 января 2026 г.	<p>-Подписан акт о передаче здания детского сада на капитальный ремонт подрядчику;</p> <p>-Рабочие ООО «СК СТРОЙСЕРВИС» приступили к демонтажу дверных проемов и напольного покрытия (линолеума) в групповых помещениях.</p> <p>До 16 января полностью сняты двери и линолеум в групповых помещениях.</p>	  	     

4- 13
марта
2026

Начались работы по замене электропроводки в групповых помещениях: разметка и монтаж кабель-каналов, прокладка проводов, установка розеток, выключателей, распределкоробок.



16- 20
марта
2026 г.

Начинаются работы по
монтажу системы
отопления: устройство
проходных отверстий под
стояки инженерных сетей



23-28
марта
2026 г.

Продолжаются работы:
- по монтажу системы
отопления: устройство
проходных отверстий под
стояки инженерных сетей,
установка креплений под
трубопровод отопительной
системы
- по монтажу новой
электропроводки (монтаж
кабель-каналов, установка
розеток).



25 -30
марта
2026

Снятие настенной и
напольной плитки в
санузлах и моечных в
группе, демонтаж унитазов
и раковин в санузлах
групповых помещений




30 марта -
3 апреля
2026 г.

- Прокладка трубопровода
отопительной системы
- Демонтаж санузлов. До 1
апреля работы полностью
завершены
- Продолжаются работы по
монтажу новой
электропроводки.




31 марта -
3 апреля
2026

Приступили к оформлению
фасада детского сада.
Устанавливаются леса,
завезен утеплительный и
отделочный материалы

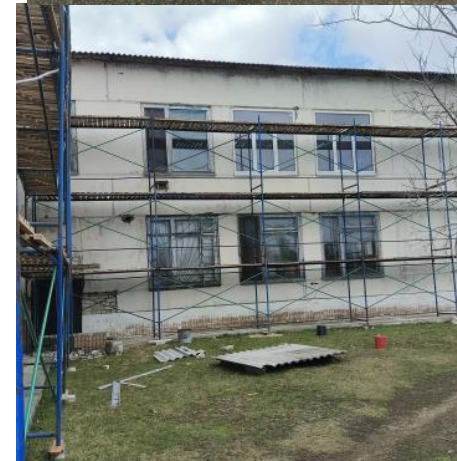

06 – 11
апреля
2026

- Строители приступили к работам по утеплению фасада минплитой (первый этап в технологии «мокрый фасад»)
- Прокладывается кабель-канал для электропроводки.
- Ведутся работы по монтажу отопления
- Завершены работы по демонтажу радиаторов во всем здании

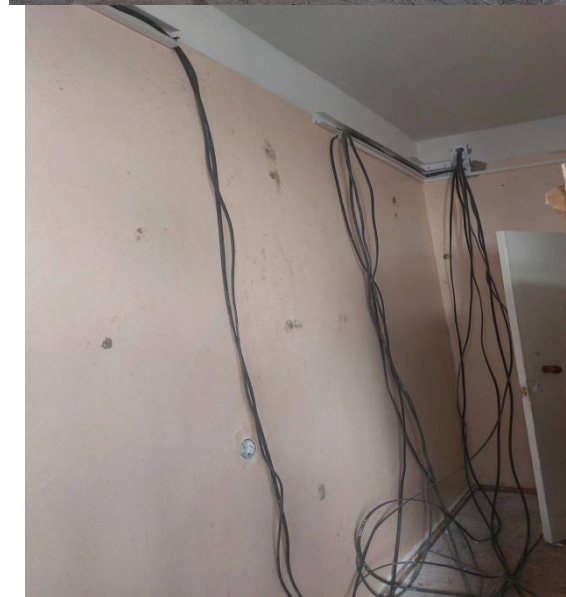


13 – 17
апреля
2026

Ведутся работы по
монтажу отопления.



Продолжаются работы по
монтажу новой
электропроводки (монтаж
кабель-каналов, установка
розеток, выключателей).

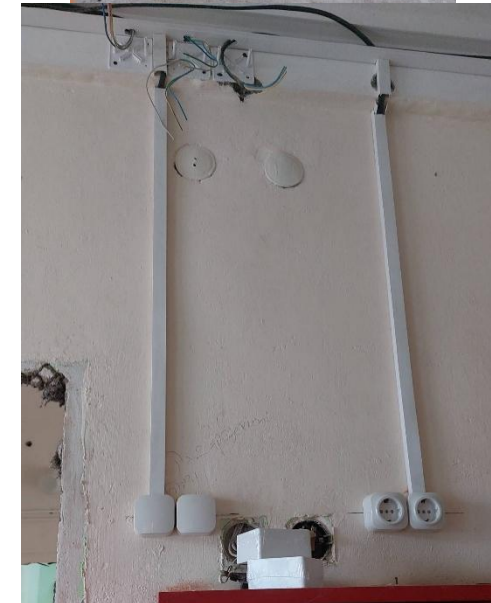

Идет работа по утеплению фасада



25 - 25
апреля
2026


Началась установка новых
пластиковых окон




Произведено утепление части фасада здания. Стартовали работы по базовой штукатурке фасада



Продолжается монтаж новой электропроводки, в том числе в подвале (монтаж кабель-каналов, установка розеток, выключателей).

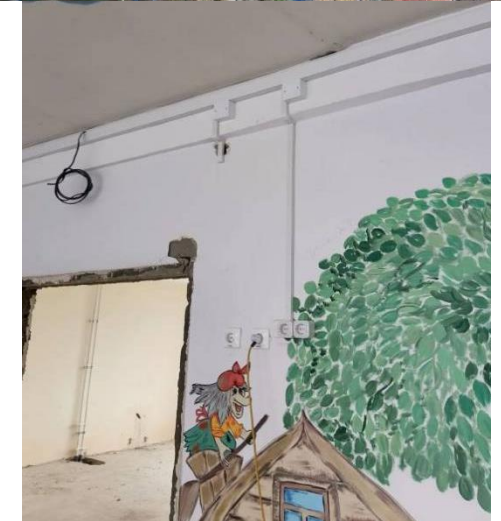

Ведутся дальнейшие работы по монтажу отопления.

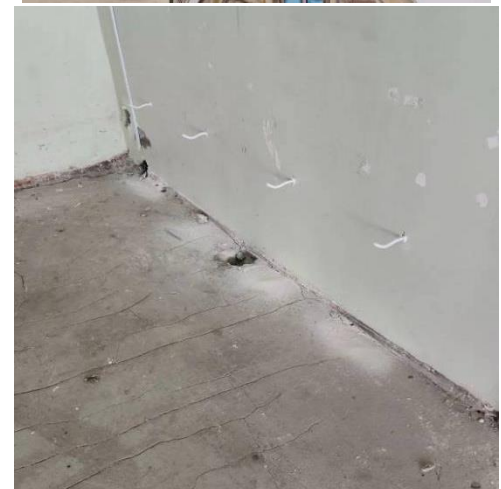

27 апреля
-
1 мая
2026

Производится монтаж
отопления (обвязка
радиаторов)

Производится очистка,
грунтовка, шпатлевка
потолков

Продолжаются работы по
монтажу новой
электропроводки



4 – 8 мая
2026

Продолжаются работы по
монтажу новой
электропроводки, монтажу
отопления

Идет очистка, грунтовка,
шпатлевка потолков

Произведена грунтовка
утепленной части фасада
здания, продолжается
утепление остальных стен
фасада

Устанавливаются окна



11- 15 мая
2026

Продолжаются работы по монтажу новой электропроводки, монтажу отопления

Утепленная часть фасада здания покрыта мокрой штукатуркой, продолжается утепление фасада по периметру



18 – 22
мая 2026

Ведутся работы по
монтажу новой
электропроводки, монтажу
отопления



Утепленная часть фасада
здания покрашена краской,
продолжается утепление
фасада по периметру



Устанавливаются новые
пластиковые окна




25 – 29
мая 2026

Продолжаются работы по
монтажу новой
электропроводки, демонтаж
старого
электрооборудования

Подходят к завершению
монтаж отопления

Идет очистка, грунтовка,
шпатлевка потолков

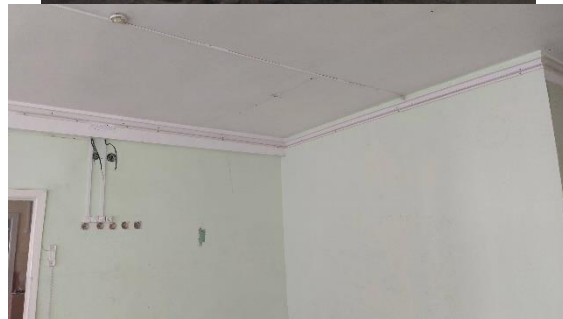

01 – 06
июня
2026



Продолжаются работы по
монтажу новой
электропроводки на
пищеблоке и в
физкультурном зале



Производится грунтовка,
шпатлевка потолков



Один из входов в здание подготовлен: стены оштукатурены и покрашены. Продолжается утепление фасада по периметру здания

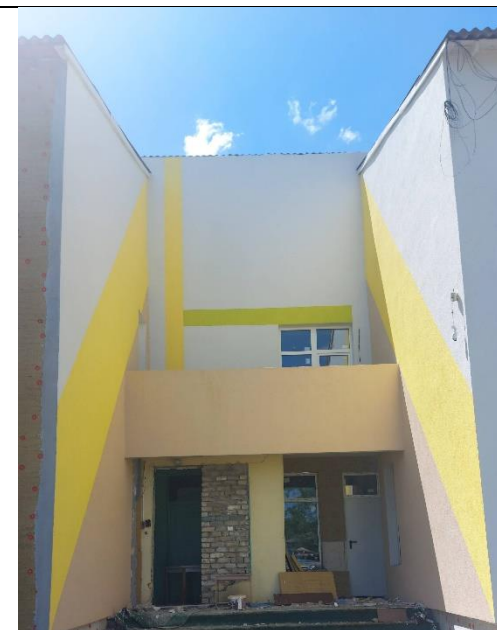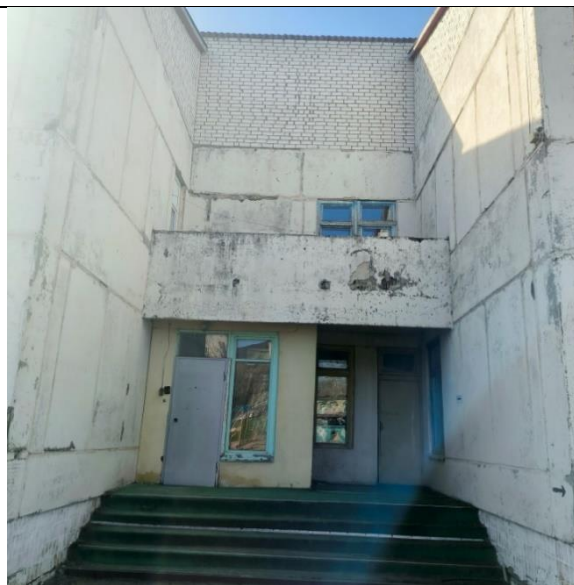

Начались работы по устройству новой канализации



Устанавливаются новые пластиковые окна



8 – 12
июня
2026

Монтаж новой
электропроводки в
групповых помещениях

Демонтаж крыши крыльца,
закатка кровельным
материалом крыши
крыльца

Устройство канализации

Утепление, дюбелирование
фасада здания



15 – 19
июня
2026

Монтаж новой
электропроводки, демонтаж
старых щитов



Закончен монтаж
канализации



Шпатлевка стен,
подготовка под покраску



		<p>Нанесение базовой штукатурки на фасад</p>		
	<p>22 -26 июня 2026</p>	<p>Отштукатурены и покрашены 6 стен фасада и главный вход в здание. Продолжается утепление фасада по периметру здания</p> <p>Устанавливаются новые окна, входные двери</p> <p>Продолжается монтаж новой электропроводки</p>	 	  

Идет смывка старой штукатурки со стен, шпатлевка стен в групповых помещениях 2 этажа



Ведутся работы по монтажу водопровода горячего и холодного водоснабжения

